



बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली

कार्यक्षेत्र सिन्धुली रामेछाप



आ.व २०८१/८२ को
वार्षिक प्रगति

दुर्गा प्रसाद घिमिरे
कार्यालय प्रमुख




आ.व.२०८१/०८२ को बार्षिक प्रगती विवरण

चालु र पूँजिगत खर्च शिर्षकको प्रगती विवरण:


क.	चालु खर्च			रकम रु. हजारमा		
क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	सब ब.उ.शि.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ. व. २०८१/८२ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०४०११३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	19000.00	14422.58938	75.91%	
		जम्मा	19000.00	14422.58938	75.91%	

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय चालु

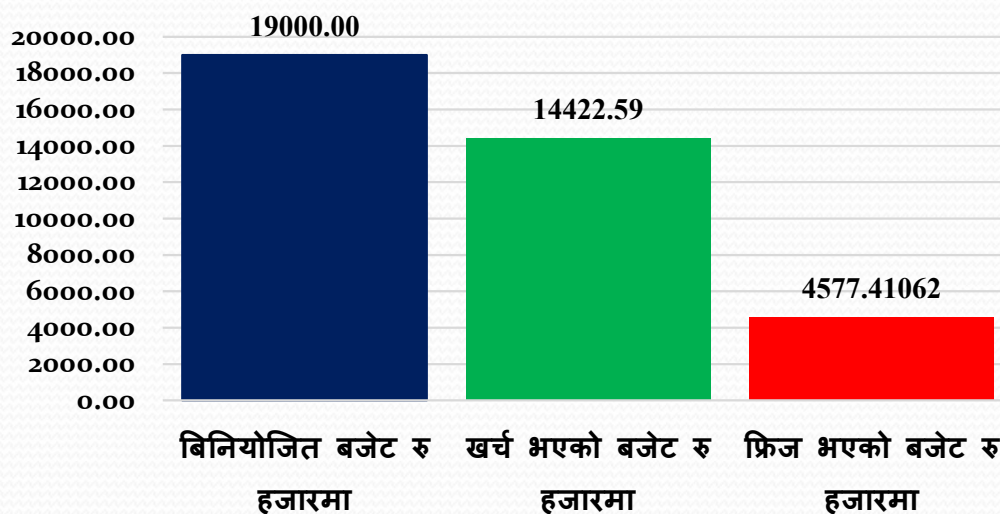


ख.	पूँजीगत खर्च			रकम रु. हजारमा		
क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	सव ब.उ.शि.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ. व. २०८१/८२ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०४०११४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	413446	330257.91	79.88%	
२	३३७००१२१४	बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम	20000	13968.006	69.84%	
		जम्मा	433446	344225.92	79.42%	

बागमती प्रदेश पूजिगत बजेट

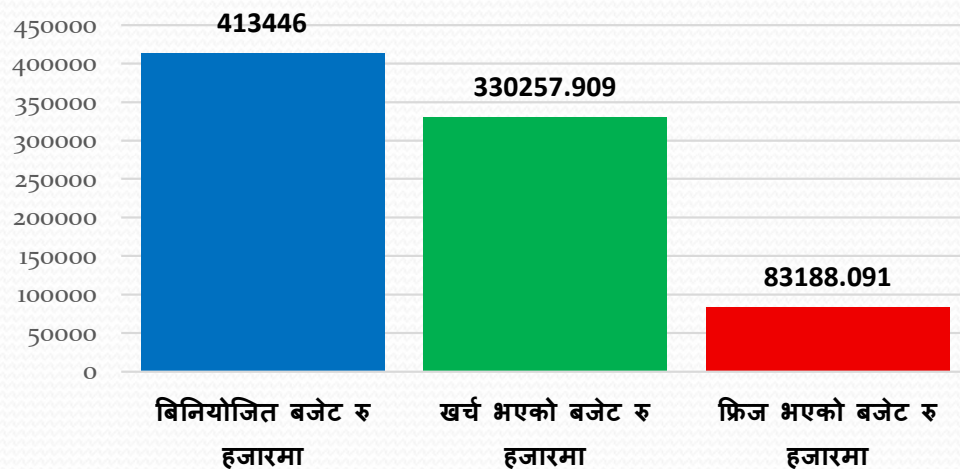

बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम

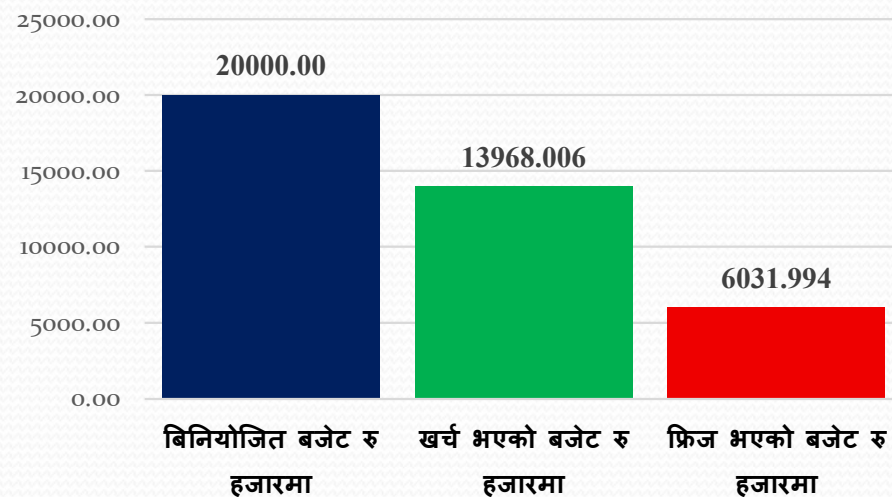

हाल सम्मको सम्झौता संख्या	हाल सम्मको सम्पन्न संख्या
107	57


५. पूँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगती विवरण: विशेष अनुदान

रकम रु. हजारमा



पूँजीगत खर्च(बिशेष अनुदान तर्फ)				रकम रु. हजारमा		
क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ. व. २०८१/८२ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०४०११४	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	40000	35961.748	89.90%	
		जम्मा	40000	35961.748	89.90%	

खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम

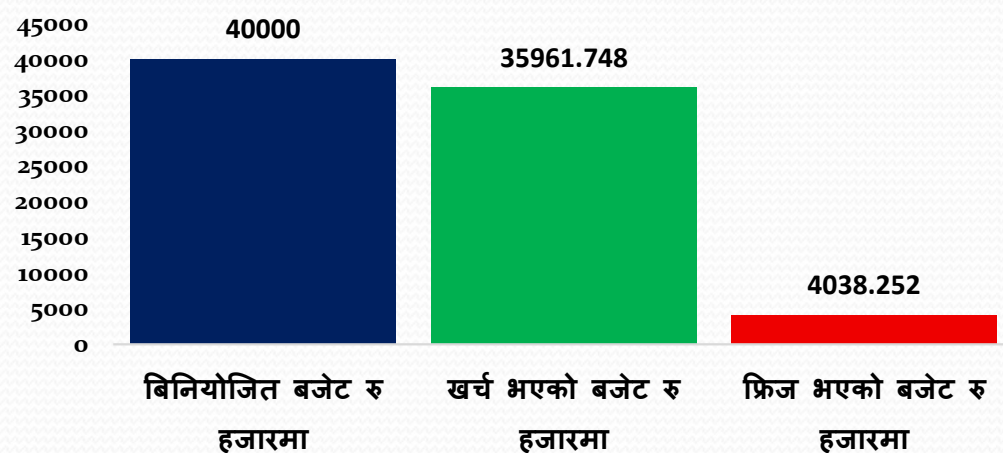

सम्झौता संख्या	सम्पन्न संख्या
601.00	535.00

६. आ.ब.०८०/०८१ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरु: प्रदेश

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:								रकम रु हजारमा				
क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
1	11.4.22.54-कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	2077.11.11	2081.11.11	85223.08	45887.28	7511.19	10600	5474.579	12985.769	80.00%	74.07%	सम्पन्न
2	11.1.2.1281-सब डीभिजन बन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्धेशोर सिन्धुली	2080.10.25	2082.06.09	31793.77	17532.14	7511.19	10600	3074.03	10585.2	70.00%	60.38%	बाकी
3	11.1.2.1285-रेडक्रस सोसाईटी भवन बेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली	2080.09.23	2081.06.20	10393.74	6500.08	4764.91	1810	1735	6499.91	100.00%	100.00%	सम्पन्न

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
4	11.4.38.3823- रंगशाला मार्ग स्तारुन्नती कमलामाई न.पा.- ०४,सिन्धुली	2080.10.15	2081.11.15	48971.16	30781.65	8375.36	14500	19182.174	32957.534	100.00%	107.07%	सम्पन्न
5	11.4.38.4236- संगमचोकदेखि श्री कमला जनज्योति मा.बि स्कुल चोक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५	2080.09.26	2081.09.26	18800.43	12561.22	10597.24	1000	940.282	11537.522	100.00%	91.85%	सम्पन्न
6	11.1.2.1319- प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली	2080.11.23	2082.05.10	161666.74	93666.17	15421	39483	39423.606	71199.106	80.00%	76.01%	बाकी

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
7	11.1.2.1439-सामुदायिक भवन निर्माण कमलामाई नगरपालिका वडा नं-13 सिन्धुली (कमला एकता क्लवको प्राणङ्ग)	2081.02.26	2081.06.29	9000	5104.4	4450.43	2400	653.97	5104.4	100.00%	100.00%	सम्पन्न
8	11.6.25.407-चकमके बजार एकिकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजना, तीनपाटन-११, सिन्धुली		2082.08.25	45000	39007.07	0.00	15000	1191.225	7991.23	20.00%	20.49%	बाकी
9	11.4.38.5735-वेलघारी दुग्धफेदी सडक सिन्धुली		2082.08.25	45000	31325.43	0.00	15000	2362.255	8362.26	10.00%	26.69%	बाकी

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुबर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
10	11.4.38.5738-एकिकृत माझी बस्ती विकास पूर्वाधार निर्माण तौनपाटन-03 सिन्धुली		2082.08.25	15000	9827.60	0.00	5000	1455.192	3164.19	35.00%	32.20%	बाकी
11	11.4.38.5736-मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७ को नयाँबस्ती देखि देउजर सम्म सहरी विकास परियोजना संचालन गर्ने कार्य, मरिण गा.पा. वडा नं. ६ र ७		2082.08.25	15000	9476.42	0.00	5000	1629	3237.00	35.00%	34.16%	बाकी
12	11.1.2.1606-कल्पवृक्ष सब डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली		2082.08.25	30000	14979.18	0.00	10000		3138.00	10.00%	20.95%	बाकी

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
13	माझीटार माझिडाँडा स्वर्गधारी सडक क.न.पा-७ सिन्धुली		2082.08.25	15000	8565.99	0.00	14500		744.00	0.00%	8.69%	बाकी
14	11.6.25.532- गुन्साल एकिकृत वस्ती भौतिक पूर्वाधार विकास/निर्माण, दोरम्बा-5, रामेछाप		2082.08.25	15000	8199.62	0.00	4000		1430.00	5.00%	17.44%	बाकी
15	11.4.38.5847- झार्लाडटार मन्दिरबाट उत्तरतर्फ जिघाँखोला जाने बाटो स्तरोन्नति, तीनपाटन ३		2082.06.15	9000	7287.50	0.00	7579	280.88	1546.88	5.00%	21.23%	बाकी

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुबर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम(Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम(Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
16	11.1.2.1808- जल कन्या अधरो स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न कनपा-३ सिन्धुली		2082.06.15	4000	2944.49	0.00	3063	1393.385	1903.39	65.00%	64.64%	बाकी
17	11.1.2.1855- वि.पि स्मृति भवन निर्माण तिनपाटन ११, सिन्धुली		2082.06.15	3000	1997.67	0.00	2080	1688.189	1688.19	85.00%	84.51%	बाकी
18	11.4.38.6619- तल्लो धनसरी माझीटोल समुह घर निर्माण,दुधौली-11		2082.06.15	2100	1767.82	0.00	1838	933.296	1086.30	62.00%	61.45%	बाकी

आ.ब.०८१/०८२ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय र श्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न हुने मिति	स्वीकृत लागत रकम (Vat र Ps सहित)	सम्झौता रकम (Vat र Ps सहित)	आ.ब ०८०/०८१ सम्म खर्च भएको रकम	आ.ब ०८१/०८२ मा विनियोजित रकम	यस आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको खर्च	हाल सम्मको खर्च	(%)हाल सम्मको भौतिक प्रगति	(%)हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	कैफियत
19	11.4.38.7775-गडामे वडा कार्यालय हुँदै पराँशे डुम्रे सडक स्तरोन्नती, तिनपाटन-६		2082.06.15	3000	3000.00	0.00	3000	2535.258	2535.26	85.00%	84.51%	बाकी
20	11.4.38.7875-लक्ष्मीडाडा वडा कार्यालय सम्म सडक स्तरउन्नति सुनकोशी ४		2082.06.15	3000	2194.74	0.00	2282	1807.202	1807.20	83.00%	82.34%	बाकी
	जम्मा			140573.54	0.00	88342	15275.882	38633.88	140573.54			



७. आवास तर्फ प्रगति विवरण

रकम रु. हजारमा

आवास विवरण								रकम रु हजारमा	
क्र.स	कार्यक्रमको नाम	कार्यान्वयन भएको जिल्ला	स्वीकृत लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको सम्झौता संख्या	हाल सम्मको सम्पन्न संख्या	विनियोजित बजेट		खर्च	
						आ.व २०८०/८१ सम्म	आ.व २०८१/८२ मा	आ.व २०८०/८१ सम्म	आ.व २०८१/८२ मा
३	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम					34000	40000	22611	35961.748
		रामेछाप	1250	66	17				
		सिन्धुली	3325	690	373				
	जम्मा		4575	756	390				
४	बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम					20000	20000	19462.41	13968.006
		रामेछाप	26	0	0				
		सिन्धुली	107	50	0				
	जम्मा		133	50	0				
	कुल जम्मा		4708	812	446	54000	70000	42073.41	10739.18

आ.ब. २०८१/०८२ मा स्वीकृत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	एकाई	जम्मा लक्ष्य	जम्मा प्रगति	भौतिक प्रगति
१	सडक निर्माण/स्तरोन्नति	106				
१.१	नयाँ ट्रयाक निर्माण	2	कि.मि.	1	1	100.00%
१.२	ग्राभेल स्तरमा सडक स्तरोन्नति		कि.मि.	2.079	2.129	102.41%
१.३	कालोपत्रे स्तरमा सडक स्तरोन्नति		कि.मि.	10.3495	3.6375	35.15%
१.४	ढलान स्तरमा सडक स्तरोन्नति		कि.मि.	5.9228	5.00176	84.45%
१.५	पक्की नाला		कि.मि.	6.5947	5.15624	78.19%
१.६	मेसनरी/पल्म टेवा पर्खाल		कि.मि.	5.81196	5.56781	95.80%
१.७	ग्याबियन टेवा पर्खाल		कि.मि.	1.1515	1.1189	97.17%
१.८	ढुंगा छाप्ने काम सोलिङ्ग		कि.मि.	1.05532	1.04195	98.73%

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या	एकाई	जम्मा लक्ष्य	जम्मा प्रगति	भौतिक प्रगति
३	पुल/कलभर्ट निर्माण					
३.३	कलभर्ट	4	गोटा	4.00	4.00	100.00%
४	भवन निर्माण					
४.१	सरकारी भवन	3	गोटा	3.00	1.00	33.33%
४.२	सामुदायिक भवन	16	गोटा	16.00	15.00	93.75%
४.३	सरकारी भवन मर्मत	7	गोटा	7.00	13.00	185.71%
५	अन्य सार्वजनिक निर्माण (पार्क. पदमार्ग)	2	गोटा			
५.२	पदमार्ग/ वाल आदि	2	कि.मि.	1.04	0.79	75.41%
६	बस्ति विकास					
६.१	बजार केन्द्र पालिका केन्द्र बस्ति बिकास	2	गोटा	2.00	0.00	20.00%
६.४	जनता आवास कार्यक्रम (प्रदेश)	1	गोटा	76.00	42.00	55.26%
६.५	खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रम	1	गोटा	601.00	535.00	89.02%



रकम रु. हजारमा

१२. बेरुजु फछ्यौट विवरण

आ.व	बेरुजु रकम			फछ्यौट रकम			प्रगति(%)	बाकी बेरुजु		
	असुल गर्नुपर्ने	नियमित	पेशकी	असुल गर्नुपर्ने	नियमित	पेशकी		असुल गर्नुपर्ने	नियमित	पेशकी
२०७५/७६	35.37	385.06	0.00	0.00	328.52	0.00	0.78	0.00	56.54	0.00
२०७६/७७	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00
२०७७/७८	123.16	5831.26	0.00	123.16	5831.26	0.00	100	0.00	0.00	0.00
२०७८/७९	0.00	34492.85	0.00	0.00	34095.16	0.00	99	0.00	397.69	0.00
२०७९/८०	6.08	1324.92	0.00	6.08	20.01	0.00	0.02	0.00	1304.91	0.00
२०८०/८१	192.59	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.59	1002.00	0.00
जम्मा	357.20	43036.10	0.00	129.24	40274.95	0.00	0.93	192.59	2761.15	0.00

- असुल गर्नु पर्ने 192.59 लाख असुली प्रकृत्यामा गएको
- नियमित गर्नुपर्ने 2761.15 मध्ये 808.00 लाख र 1304 लाख नियमित भएको छ
- बाकी बेरुजु 649.15 लाख बाकी छ।



१३. संकलन भएको राजस्व

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	राजश्व शीर्षक	संकलित राजस्व
१	१४२२९	543.000
२	१४३१२	0.000
३	१५१११	161.321
	जम्मा	704.321

आ.व. २०८२/८३ को कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजना

सि.नं.	विवरण	संख्या	बजेट	प्रस्तावित कार्यन्वयन बिधि
१	१० लाख भन्दा साना	२	१००००००	शिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै बार्ता
२	१० देखि २५ लाख सम्मका	८५	१५१३०००००	बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र र उपभोक्ता समिति
३	२६ देखि ५० लाखसम्मका	३५	१३६००००००	बोलपत्र
४	५१ लाख देखि १ करोड सम्मका	६	३४५०००००	बोलपत्र
५	१ करोड भन्दा माथि	१४	२२५३०००००	बोलपत्र
	जम्मा	142	548100000	

आ.व. २०८२/८३ को प्रस्तावित बहुबर्षीय आयोजनाहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	प्रस्तावित बजेट
1	जलश्रोता तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण रामेछाप	20000	60000
2	पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रयोगशाला एवं सहरी विकास तथा भवन फिल्ड एकाइ कार्यालय, सानीमदौम मन्थली	15000	45000
3	जखनीटार जवदे चनखु वडा कार्यालय पोखरी सडक मन्थली-10, रामेछाप	7500	22500
4	वेलघारी दुग्गेफेदी सडक सिन्धुली दोश्रो चरण	13500	40500
5	हस्पिटल कुमालटार हुँदै हिमगंगा मा.वि. सडक ट्रयाक खोल्ने, रामेछाप-3 रामेछाप	4500	13500
6	पालेवन बाउन गाउँ हुँदै पिपल बोट मट्केला सडक स्तरोन्नती कार्य मन्थल- 13 रामेछाप	4500	13500
7	चकमके बजार एकिकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजना, तीनपाटन-११, सिन्धुली दोश्रो चरण	27000	81000
8	खाडादेवी जग्गा विकास सहित पालीका केन्द्रमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण खाडादेवी गापा रामेछाप	18000	54000

आ.व. २०८२/८३ को प्रस्तावित बहुबर्षीय आयोजनाहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	प्रस्तावित बजेट
9	तिनपान गापाका बजार केन्द्रहरूको एकिकृत पुर्वाधार विकास सिन्धुली	18000	54000
10	"बागमती प्रदेश शिब सर्किट परियोजना", अन्तरगत भौतिक पुर्वाधार निर्माण	27000	81000
11	चकमके पानीटंकी परासे सडक स्तरउन्नती तिनपाटन-11, सिन्धुली	3000	9000
12	रामेश्वरधाम धन्सारे पानीटंकी सडक कमलामाई-6 सिन्धुली	5000	15000
13	२ नं बजार दुर्गाटोल सडक स्तरउन्नती कार्य कमलामाई-६ सिन्धुली	4000	12000
14	दुधौली बासबोट बटाहा सडक दुधौली नपा-8 सिन्धुली	5000	15000
15	राम मिन्दर गिरि बस्ति सडक स्तरउन्नती कार्य मन्थली १३ रामेछाप	4500	13500
16	11.4.38.9439 सोल्पा भन्ज्याङ बजार ढलान तथा नाला व्यवस्थापन फिक्कल ५ सिन्धुली	3500	10500

आ.व. २०८२/८३ को प्रस्तावित बहुबर्षीय आयोजनाहरू

सि.नं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	प्रस्तावित बजेट
17	11.4.38.9149सिमलडाँडा गैरी धोवी सडक स्तरोन्नती लिखु तामाकोशी-6, रामेछाप	5000	15000
18	11.4.38.10321खादबारी तामाकोशी अस्पताल लाईन दिपज्योती मार्ग सडक स्तरोन्नति कार्य मन्थली १ रामेछाप	4500	13500
19	11.4.38.9322ज्याम्कीरि कात्ले जोड्ने सडक निर्माण गोकुलगगा गा.पा.- ६ फर्पु	4500	13500
20	11.4.38.9585मदन भण्डारी लोकमार्ग रुजि बर्सपार्क सडक नाला तथा ढलान, हरिहरपुरगढी 3, सिन्धुली	3500	10500
21	11.4.38.9149सिमलडाँडा गैरी धोवी सडक स्तरोन्नती लिखु तामाकोशी-6, रामेछाप	5000	15000
22	11.4.38.10380ढोके आप साडी टोल सडक स्तरोन्नति खाडादेवी-४ रामेछाप	4000	12000
23	11.1.2.2006भैंसेफेदी सभाहल निर्माण घ्याङ्लेख गापा ४, सिन्धुली	2500	7500
24	11.1.2.2017 वडा सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माण लगुरखोला,तीनपाटन गाउँपालिका ५	2500	7500
	जम्मा	211500	634500

विवरण	संख्या	कारवाही संख्या	सम्बोधन (फछ्यौट)प्रतिशत
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु	१	१	
हेलो सरकारको उजुरीहरु	१	१	
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	०	०	
संघ, प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट प्राप्त			
कूल	२	२	

सेवा प्रवाह/सुशासनको लागि गरिएको उल्लेखनिय प्रयासहरु:

- १.
- २.
- ३.



आयोजनाको कार्यान्वयनका फोटोग्राफहरु

सरकारी/सामुदायीक भवन



दलित सामुदायीक भवन प्रिती



जिसस/पुर्वाधार कार्यालय भवन सिन्धुली



कमला सामुदायीक भवन सिन्धुली र अधुरो सा.भ. रामेछाप



रंगशाला मार्ग



सडक पिसिसि ढलान दुनपा-10



अन्य सार्वजनिक निर्माण शहरी सौन्द्यीकरण




शहरी पार्क तथा खम्बेचौर सौन्द्यीकरण सिन्धुली



पोलीटेक्निकल ईन्सिच्युट रामेछाप कम्पपाउण्ड

फिल्डमा क्वालिटी कन्ट्रोल सम्बन्धी

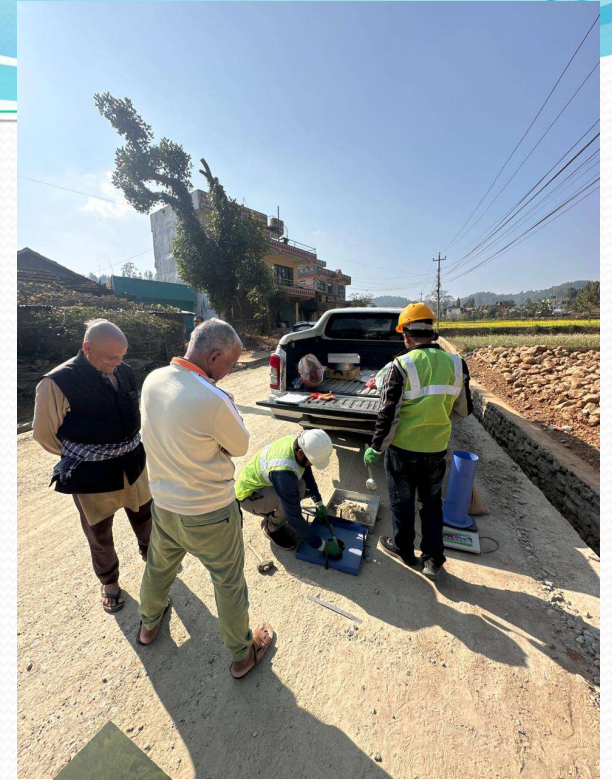


फिल्डमा क्वालिटी कन्ट्रोल सम्बन्धी



फिल्ड टेष्ट

योजनाको जानकारी अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण

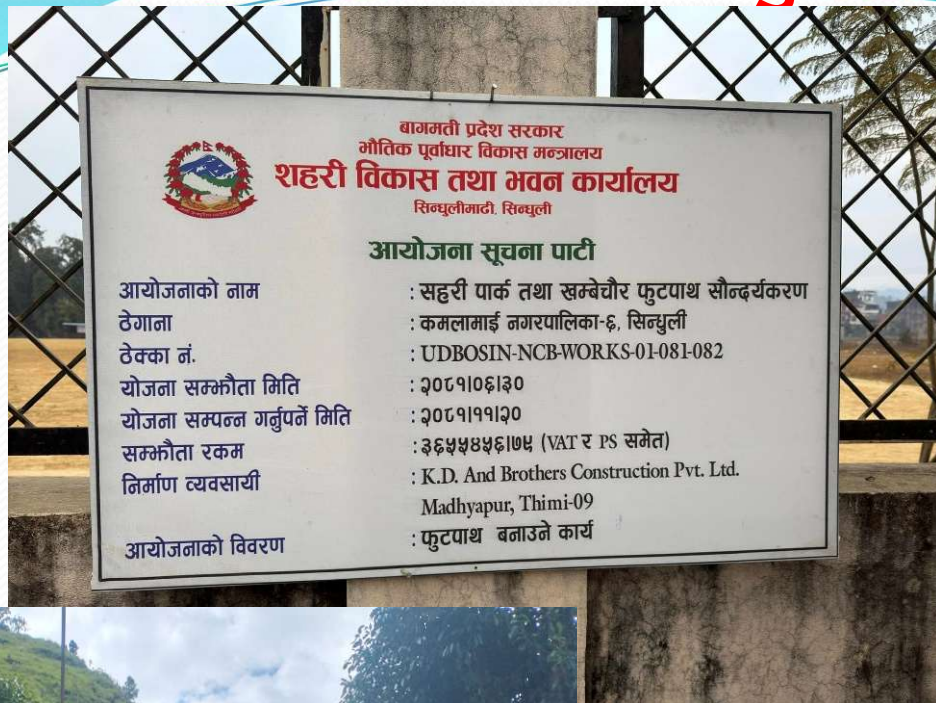

चकमके बजार एकिकृत पूर्वाधार बातावरणिय अध्ययनको सार्वजनिक सुनुवाही



सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

तीनपाटन गाउँपालिका वडा नं ११ चकमके बजार एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम।

मिति: २०८१/१०/१२
स्थान: चकमके बजार, तीनपाटन गा.पा.

प्रामर्शदाता
हाईड्रोकोन नेपाल प्रा.ली.
शंखमुल, काठमाडौं

प्रस्तावक
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
सिन्धुलीमाडी, सिन्धुली
बागमती प्रदेश

बजार केन्द्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी छलफल



बागमती प्रदेश खरको छाना उल्मुलन कार्यक्रम



बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम





समुद्घाटन



■

धन्यवाद
